

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# Лабораторная работа № 1 по курсу "Экономика программной инженерии" Вариант 1

Студент Белоусова Ю.С.

Группа ИУ7-81Б

Преподаватель Барышникова М.Ю.

## Тренировочное задание

#### Задание:

 Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками:

Название	Длительность
работы	(дни)
Работа А	12
Работа В	6
Работа С	10
Работа D	7
Работа Е	9
Работа F	8
Работа G	10
Работа Н	10
Работа I	6
Работа Ј	5

Дата начала проекта – 1-й рабочий день марта текущего года.

Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

- 1. Предусмотреть, что D исходная работа проекта;
- 2. Работы С, Е и F начинаются сразу по окончании работы D;
- 3. Работы A и J следуют за C, а работа G за F;
- 4. Работа I следует за A, а работа В за G;
- 5. Работа H начинается после завершения E, но не может начаться, пока не завершены I и B.

Для тренировочной работы используются настройки по умолчанию. Рабочий день 8 часов — с 8:00 — 17:00 с учетом обеда. Первый рабочий день — понедельник 1.03.2021. Настроено автоматическое планирование задач.

На рисунке 1 показано планирование задач согласно заданию варианта 1.

	0	Ta: Mc ▼	Task Nam: ▼	Duration <b>▼</b>	Start <b>▼</b>	Finish •	Predecessors
0		<b>-</b>	<b>⊿</b> трени	45 days	Mon 01.03.2	Fri 30.04.21	
1		<b>-</b>	Α	12 days	Wed 24.03.21	Thu 08.04.21	3
2		<u>_</u>	В	6 days	Mon 05.04.21	Mon 12.04.21	7
3		<u>-</u>	С	10 days	Wed 10.03.21	Tue 23.03.21	4
4		*	D	7 days	Mon 01.03.21	Tue 09.03.21	
5		<u>_</u>	E	9 days	Wed 10.03.21	Mon 22.03.21	4
6		<u>-</u>	F	8 days	Wed 10.03.21	Fri 19.03.21	4
7		<u>-</u>	G	10 days	Mon 22.03.21	Fri 02.04.21	6
8		<u>-</u>	Н	10 days	Mon 19.04.21	Fri 30.04.21	5;9;2
9		- <del>-</del> >	I	6 days	Fri 09.04.21	Fri 16.04.21	1
10		<b>-</b> >	J	5 days	Wed 24.03.21	Tue 30.03.21	3

#### Рисунок 1. Планирование задач

На рисунке 2 показана диаграмма Ганта.




Рисунок 2. Диаграмма Ганта

Дата начала проекта - 1.03.2021

Дата окончания - 30.04.2021

Таким образом, длительность проекта составляет 45 дней.


# Лабораторная работа 1

Содержание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

### Задание 1: Настройка рабочей среды проекта.

1. Установите дату начала проекта – первый рабочий день марта текущего года.

Для этого переходим в *Project - Project information* и в поле *Start date* устанавливаем 1.03.2021.



#### Рисунок 3. Установка даты начала проекта

- 2. Установите длительность работы в неделях, объем работ в часах, а тип работ по умолчанию- с фиксированными трудозатратами.
- 3. Установите количество рабочих часов в день равным 8, количество рабочих часов в неделю равным 40.
- 4. Задайте начало рабочей недели в понедельник, а финансового года в январе.
- 5. Установите продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов. Все указанные настройки выполняются через *File Options Schedule*.

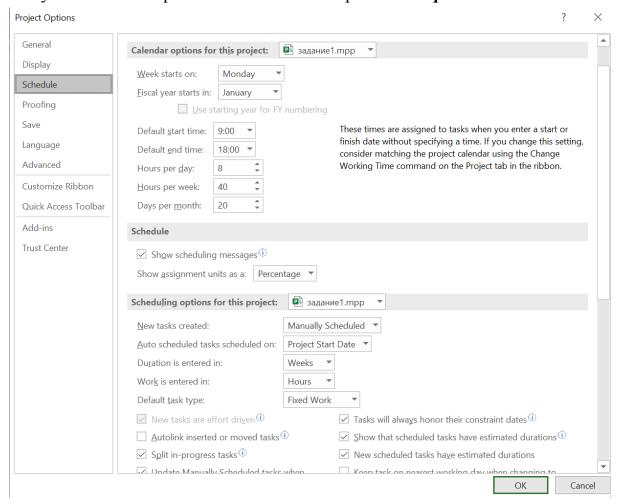


Рисунок 4. Установка настроек 2-5

- 6. Установите стандартный календарь рабочего времени
- 7. Отметьте выходные и праздничные дни на ближайшие семь-восемь календарных месяцев от даты начала проекта

Настройка календаря и праздничных дней производится через *Project - Change Working Time*.

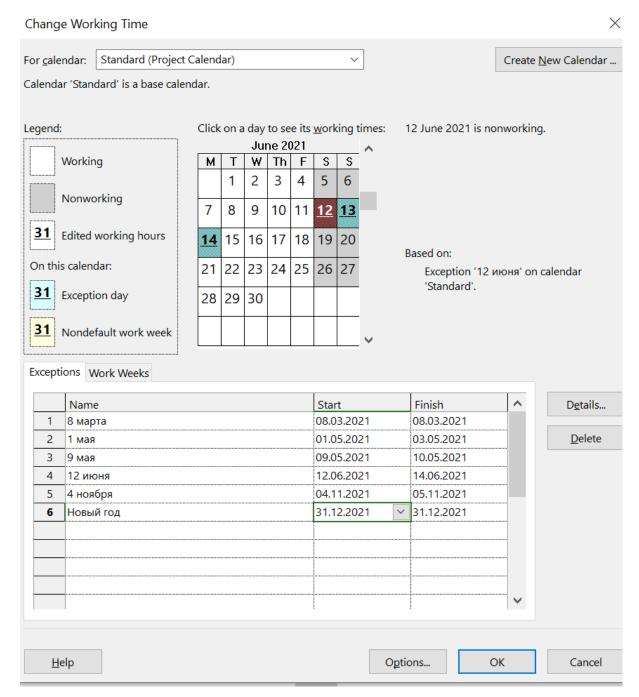


Рисунок 5. Настройка календаря и праздников

8. Выведите на экран суммарную задачу проекта и заполните вкладку Заметки информацией об основных параметрах проекта (его длительности, бюджете и количественном составе команды).

File - Info - Project Information - Advanced Properties

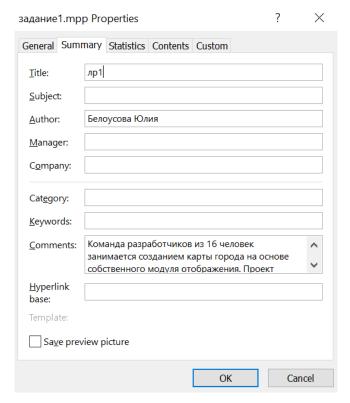


Рисунок 6. Заполнение заметок

#### Задание 2: Создание списка задач

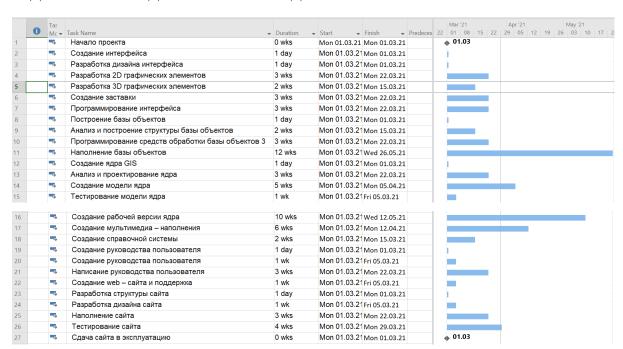


Рисунок 7. Заполнение списка задач

#### Задание 3: Структурирование списка задач

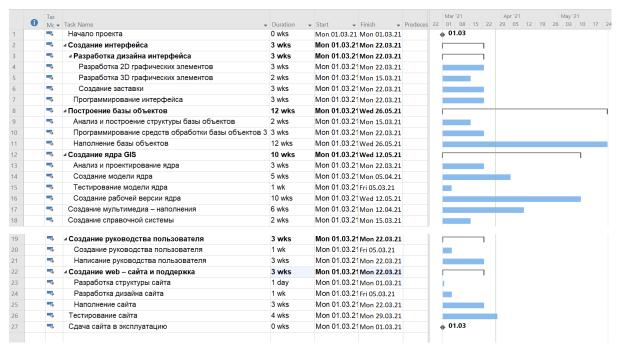


Рисунок 8. Группировка задач

# Задание 4: Установление связей между задачами

Связи можно установить через Task Information - Predecessors.

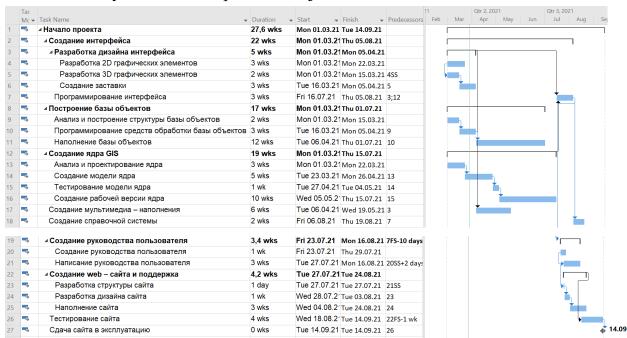


Рисунок 9. Настройка связей между задачами

# Вывод

В результате выполнения лабораторной работы было произведено планирование проекта: заданы условия его выполнения планирования, заполнен список задач, проведена их группировка, установлены связи между задачами. В итоге была получена дата окончания проекта - 14.09.2021 - и его длительность - 27,6 недель. Таким образом, условие, что проект должен быть выполнен за 6 месяцев (т.е. до 1.09.2021) не выполняется, проект не укладывается в сроки.
